

# Sachstandsbericht Baumaßnahmen

26. November 2020


# Erweiterung Kindergarten Tieringen



Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Firma: 24 Fachlose

Aktuell :  
Bodenbeläge, Endmontage Sanitär /Elektro  
Schreinerarbeiten

## Kostenmonitoring :

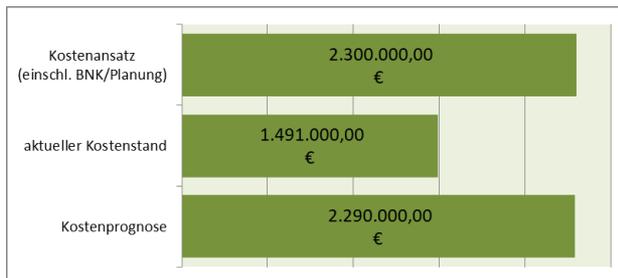

Planung / Ausschreibung

- ab 04/2017

Baubeginn

- 04/2019

Fertigstellung Gebäude

- 12/2020

Herstellung Außenanlagen

- Frühjahr 2021

# Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim




Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Firma: Fachlose

Erd-/ Rohbauarbeiten abgeschlossen.  
Fenster, Türen und Tore eingebaut

Aktuell : Installation Haustechnik

## Kostenmonitoring :

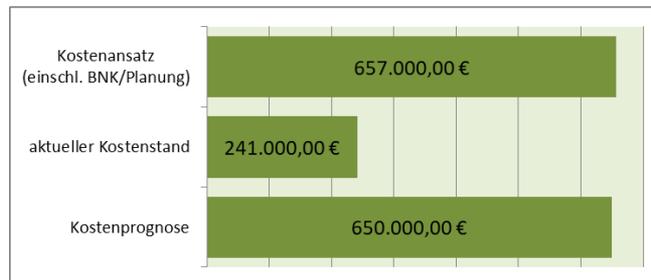

### Planung / Ausschreibung

- ab 06/2018

### Baubeginn

- 11/2019

### Fertigstellung Gebäude

- 02/2021


# Sport- und Freizeitgelände Blumersberg



Planung : Büro Sigmund, Grafenberg  
Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg  
Firma: Fa. Werner GmbH, Haigerloch

**Maßnahme abgeschlossen**  
Öffentliche Übergabe am 22.10.2020

## Kostenmonitoring :

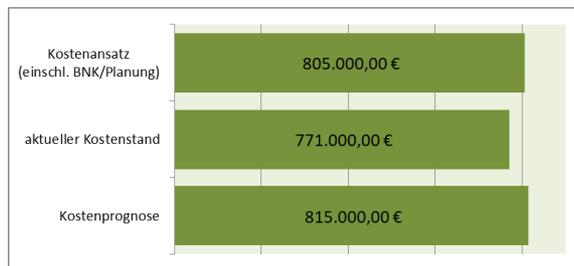

### Planung / Ausschreibung

- ab 12/2018

### Baubeginn

- 04/2020

### Fertigstellung

- 10/2020

# Sanierung „Talwiesen“ in Oberdigisheim



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Storz GmbH, Tuttlingen

Kanal- und Wasserleitungserneuerung  
Erneuerung Straßenbeleuchtung  
Breitbandverkabelung  
Erneuerung Fahrbahn und Gehweg

**Maßnahme abgeschlossen**

## Kostenmonitoring:



### Planung / Ausschreibung

- ab 01/2020

### Baubeginn

- 06/2020

### Fertigstellung

- 10/2020

# Sanierung „Zeurengasse“ in Meßstetten



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Berger GmbH, Meßstetten

Kanal- und Wasserleitungserneuerung  
Mitverlegung Gasleitung  
Erneuerung Straßenbeleuchtung  
Breitbandverkabelung  
Erneuerung Fahrbahn und Gehweg

**Maßnahme nahezu abgeschlossen**  
aktuell noch Restarbeiten

## Kostenmonitoring:



Planung / Ausschreibung

- ab 01/2020

Baubeginn

- 06/2020

Fertigstellung

- 11/2020

# Erschließung Schuppengebiet „Ried“, Heinstetten




Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Robert Bitzer, Meßstetten

Herstellung der Erschließungsstraße

**Maßnahme abgeschlossen**

## Kostenmonitoring :

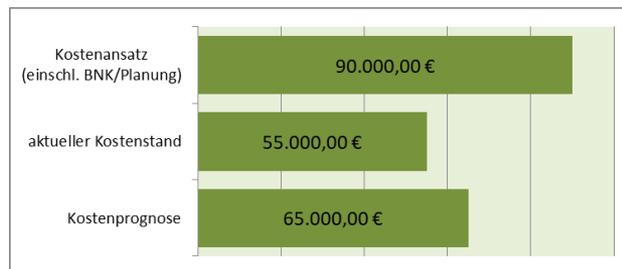

Planung / Ausschreibung

- ab 01/2020

Baubeginn

- 05/2020

Fertigstellung

- 08/2020


# Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten



Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim  
 Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim  
 Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/  
 Fa. Rack, Renquishausen

Aktuell : Kanal- / Wasserleitungsarbeiten

## Kostenmonitoring :

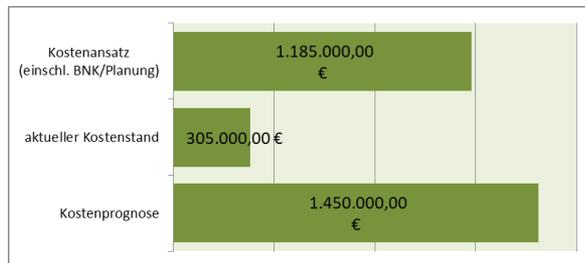

Planung / Ausschreibung

- ab 01/2020

Baubeginn

- 08/2020

Fertigstellung

- Frühjahr 2021

# Erschließung Baugebiet „Wasserfuhr“, Unterdigisheim




Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim  
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim  
Firma: Fa. Graf, Dietingen  
Fa. Rack, Renquishausen

Kanal- und Wasserleitungsarbeiten  
abgeschlossen

Aktuell : Herstellung Retentionsfläche /  
Straßenbauarbeiten

## Kostenmonitoring :

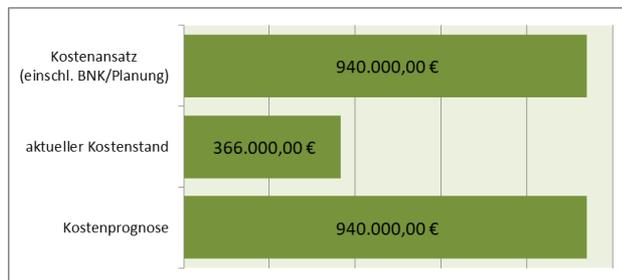

### Planung / Ausschreibung

- ab 03/2020

### Baubeginn

- 07/2020

### Fertigstellung

- Frühjahr 2021

# Neubau Jugendraum Meßstetten




Planung : Stadtbauamt  
Bauleitung: Stadtbauamt

Kanal- Wasser- und Gas-Hausanschlüsse hergestellt

Lieferung der mobilen Raumsysteme 12/20

## Kostenmonitoring :

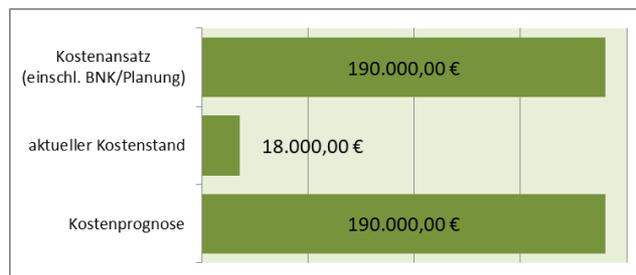

### Planung / Ausschreibung

- ab 2018

### Baubeginn

- 08/2020

### Fertigstellung

- 02/2021

## Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdigisheim
- Abbruch Gebäude Dorfstraße 7+9 in Hossingen
- Mitverlegung Breitband i.Z. des Ausbaus K7143 Tieringen-Hossingen

## Laufende Planungen

- Erweiterung Küchenbereich Heuberghalle
- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle, Hartheim
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Heinstetten
- Renaturierung Schlichem, Tieringen
- Sanierung Max-Eyth-Straße, Meßstetten
- Neubau Kiosk / Sanitäreanlagen Blumersberg
- Kanalinnensanierung 2021

## In 2020 abgeschlossene Maßnahmen

- Neubau von Urnenstelen auf dem Friedhof Oberdigisheim
- Fahrbahnsanierung im Bereich Heidenhof, Tieringen
- Abbruch Gebäude Hossinger Straße 25+27 (gepl. Ärztehaus)
- Regenerationsmaßnahme Rasenfläche Sportplatz Geißbühl
- Erneuerung Zaun Kindergarten Hossingen
- Einrichtung städt. Kindergarten im Gebäude „Sanetta“
- Hochbehälter Haselsteige, Oberdigisheim
- Sanierung Lauenstraße, Meßstetten
- Buswartehaus Eyachtalstraße, Heinstetten
- Herstellung einer Querspange L196 / L433
