

# Sachstandsbericht Baumaßnahmen

16. Dezember 2022

# Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim



Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Firma: Fachlose

Gebäude ist bezugsfertig  
Baurechtliche Abnahme Oktober 2022

## Kostenmonitoring :



## Planung / Ausschreibung

• ab 06/2018

## Baubeginn

• 11/2019

## Fertigstellung

• 10/2022

## Außenanlagen Kindergarten Tieringen



Planung : Büro Siegmund+Winz, Balingen  
 Bauleitung: Büro Siegmund+Winz, Balingen  
 Firma: Fa. Oberer, Sulz a.N.

**Maßnahme größtenteils fertiggestellt**  
**Ausstehende Restarbeiten aktuell**  
**witterungsbedingt unterbrochen**

### Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

• ab 01/2022

Baubeginn

• 07/2022

geplante Fertigstellung

12/2022


# Erneuerung der Hohnerstraße Tieringen



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Firma Cl. Müller, Albstadt

**Tiefbauarbeiten abgeschlossen**  
**Straßenbau mit Ausnahme**  
**Asphaltdeckschicht fertiggestellt**  
**Pflasterarbeiten Gehweg aktuell**  
**witterungsbedingt unterbrochen**

## Kostenmonitoring :

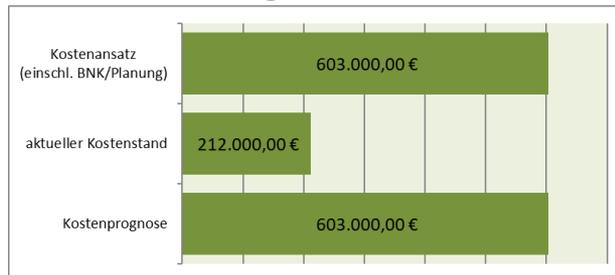

### Planung / Ausschreibung

- ab 02/2022


### Baubeginn

- 06/2022

### geplante Fertigstellung

- 12/2022  
(Asphaltdeckschicht  
Frühjahr 2023)


# Neugestaltung Dorfplatz Hossingen

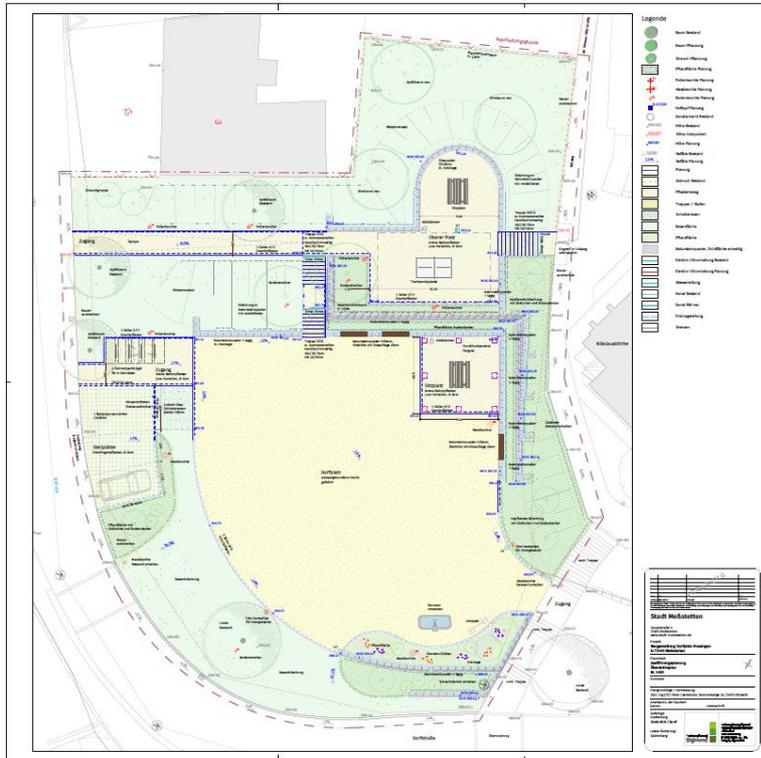

Planung : Büro Sigmund, Grafenberg  
 Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg  
 Firma: Werner, Haigerloch

**Erdarbeiten Dez 2022**  
**Oberflächengestaltung Frühjahr 2023**

## Kostenmonitoring :

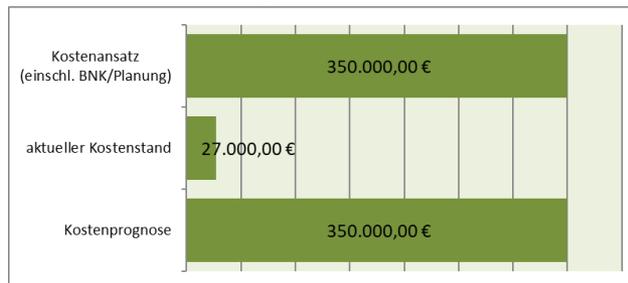

Planung / Ausschreibung

- ab 02/2022

Baubeginn

- 11/2022

gepl. Fertigstellung

- 06/2023


# Sanierung Wohngebiet Bueloch 5. BA Friedrich-List-Straße



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Firma Berger, Meßstetten

**Maßnahme mit Ausnahme  
Asphaltdeckschicht abgeschlossen**

## Kostenmonitoring :

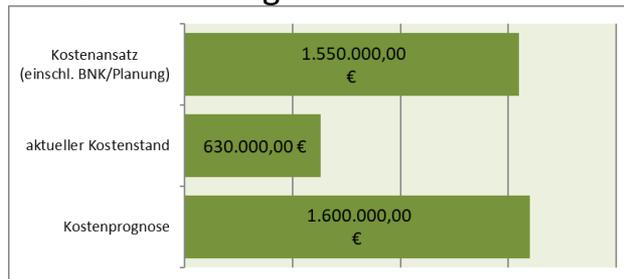

## Planung / Ausschreibung

- ab 02/2022

## Baubeginn

- 04/2022

## Fertigstellung

- 12/2022  
(Asphaltdeckschicht  
Frühjahr 2023)

# Sportgelände „Geißbühl“ Sanierung der Außensportanlagen



Planung : Planungsbüro Sigmund, Grafenberg  
Bauleitung: Planungsbüro Sigmund, Grafenberg  
Firma: Firma Moser, Reutlingen

**Baubeginn Februar/März 2023**

Planung / Ausschreibung

- ab April 2021

Baubeginn

- Frühjahr 2023

Fertigstellung

- September 2023

# Straßenendausbau „Ob dem Beurental“



Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N.  
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N.  
Firma: Firma Stingel, Schweningen

**Maßnahme abgeschlossen**

## Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

• ab 04/2021

Baubeginn

• 04/2022

Fertigstellung

• 09/2022

# Straßenendausbau „Sickersberg/Kreuzbühl“




Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N.  
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N.  
Firma: Firma Stingel, Schweningen

**Baubeginn im August 2022**

**Arbeiten aktuell wiiterungsbedingt  
eingestellt**

**Wiederaufnahme im Frühjahr 2023**

## Kostenmonitoring :

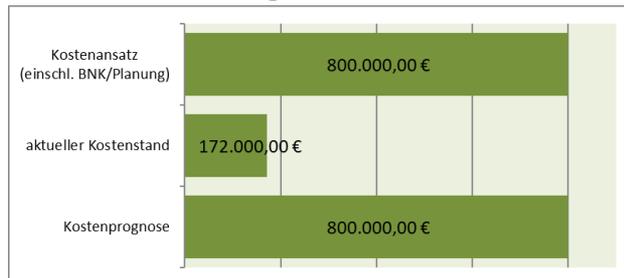

Planung / Ausschreibung

• ab 02/2022

Baubeginn

• 08/2022

gepl. Fertigstellung

• Frühjahr 2022


# Schulhofgestaltung Heinstetten

Planung : Siegmund + Winz, Balingen  
Bauleitung: Siegmund + Winz, Balingen  
Firma: N.N.

**Planung abgeschlossen**  
**Aktuell Ausschreibung Bauleistungen**



## Kostenmonitoring :

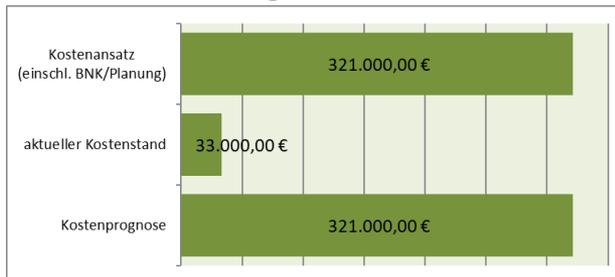

Planung / Ausschreibung

- ab 02/2022


Baubeginn

- Frühjahr 2022

gepl. Fertigstellung

- Juni 2023

## Breitbandversorgung Ausbau des Backbone-Netzes

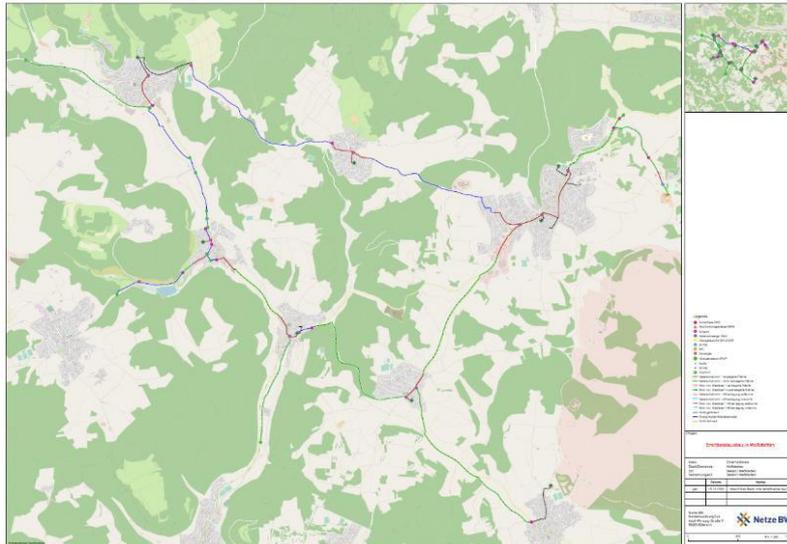


Planung : KommPaktNet /Büro Dreher+Stetter  
GU: Netze BW

**Ausbau des Backbone-Netzes  
Bau der trassenbegleitenden Hausanschlüsse**

**Maßnahme abgeschlossen**

**Ausnahme Verbindung Hartheim-Heinstetten  
(wird im Zuge Erneuerung  
Abwasserdruckleitung hergestellt)**

### Kostenmonitoring :

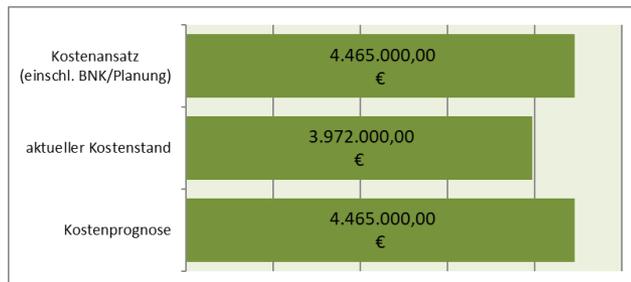

Planung / Ausschreibung

- ab 01/2020

Baubeginn

- 03/2021

Fertigstellung

- 12/2022

## Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

- Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept
- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle Hartheim
- Kanalinnensanierung
- Neubau Löschwasserbehälter in Heinstetten
- Außentoilette Schlichemhalle in Tieringen
- Sanierung Gemeindestraße „Heidenhof“, 2. Abschnitt

## In 2022 abgeschlossene Maßnahmen

- Brückenprüfungen Gesamtstadt
- Kiosk Sport- und Freizeitgelände Blumersberg
- Feldwegsanierungen (Steilstrecken)
- Sanierung Bueloch 4.BA (Max-Eyth-Straße)
- Putzsanierung Rathaus Meßstetten
- Gymnasium Meßstetten, Erneuerung Biologievorbereitung
- Betonsanierungen Kläranlage
- Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Hartheim
- Erweiterung Urnenstelenanlage Friedhof Hartheim
- Neugestaltung Beachvolleyballplatz Hartheim
- Dachsanierung Vereinsschuppen Hartheim
- Neubau Regenwasserkanal Schönfeldstraße Heinstetten
- Fassadensanierung Rathaus Hossingen
- Sanierung Radweg Unter- /Oberdigisheim
- Bodendämmung Dachgeschoss, Kindergarten Oberdigisheim
- Einbau Sektionaltore Rathaus+Feuerwehr Oberdigisheim
- Sanierung Radweg Unterdigisheim-Oberdigisheim
- Sanierung Stützmauer gegenüber Rathaus Unterdigisheim
- Abbruch Gebäude Appentalstraße 19, Unterdigisheim
- Ersatzbau Salzlager Bauhof in Unterdigisheim

## Laufende Planungen

- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Fassade und Außenanlage Jugendraum Meßstetten
- Stützmauer Buchstraße
- Erschließung „In der Breite, 2.BA“ in Oberdigisheim
- Abwasserdruckleitung Heinstetten-Hartheim
- Erneuerung Jägerstraße Hartheim
- Sanierung Schülertoiletten in Tieringen und Heinstetten
- Digitalisierung Schulen
- Erneuerung Heizung Rathaus, DRK, Feuerw. Oberdigish.
- Innensanierung Turn- und Festhalle Oberdigisheim
- Umgestaltung Freithofstraße / Ebingerstraße
