

Sachstandsbericht Baumaßnahmen

15. Dezember 2023


Breitbandversorgung FTTP-Anbindung der Schulen



Planung : KommPaktNet /Büro Dreher+Stetter
 Firma: Stumpp, Balingen

Anschluss sämtlicher Schulgebäude
Bau der trassenbegleitenden
Hausanschlüsse

Kostenmonitoring :

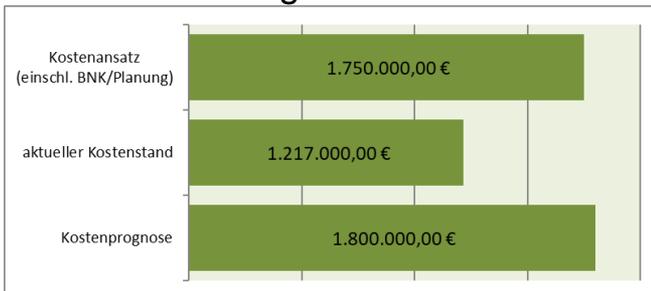

Planung / Ausschreibung

- ab 2021

Baubeginn

- Mai 2023

gepl. Fertigstellung

- Frühjahr 2024


Sportgelände „Geißbühl“ Sanierung der Außensportanlagen



Planung : Planungsbüro Sigmund, Grafenberg
Bauleitung: Planungsbüro Sigmund, Grafenberg
Firma: Firma Moser, Reutlingen

**Baustand wird in der
Gemeinderatssitzung ausführlich
erläutert**

Kostenmonitoring :

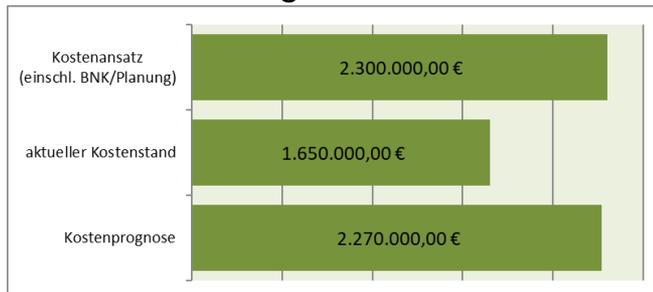

Planung / Ausschreibung

- ab April 2021

Baubeginn

- März 2023

Gepf. Fertigstellung

- Mai 2024


Straßenendausbau „Sickersberg/Kreuzbühl“



Planung : Ing.Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Bauleitung: Ing.Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Firma: Firma Stingel, Schwenningen

Maßnahme abgeschlossen

Kostenmonitoring :

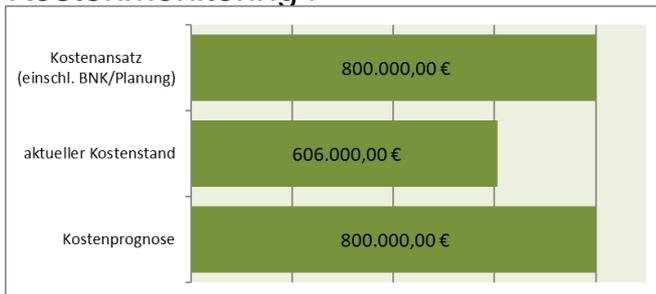

Planung / Ausschreibung

- ab Februar 2022

Baubeginn

- August 2022

Fertigstellung

- November 2023


Erneuerung der Wildensteinstraße Meßstetten



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Firma Stumpp, Balingen

Baubeginn August 2023
Nach witterungsbedingter Unterbrechung
wird die Baustelle aktuell „winterfest“
eingerrichtet.

Kostenmonitoring :

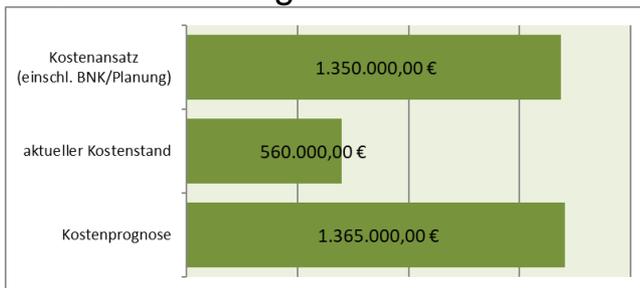

Planung / Ausschreibung

- ab Februar 2023

Baubeginn

- August 2023

Gepf. Fertigstellung

- Mai 2024


Erneuerung der Abwasserdruckleitung Heinstetten - Hartheim



Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
 Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
 Firma: Firma Koch, Ratshausen
 Firma Lohr, Ravensburg

Ausführung aktuell witterungsbedingt unterbrochen.

Kostenmonitoring :

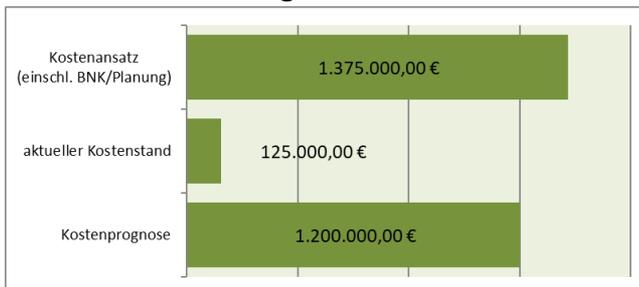

Planung / Ausschreibung

- ab 2021

Baubeginn

- Oktober 2023

Gepf. Fertigstellung

- Mitte 2024

Schulhofgestaltung Heinstetten



Planung : Schuler + Winz, Balingen
Bauleitung: Schuler + Winz, Balingen
Firma: Timberman GbR, Bitz

Maßnahme abgeschlossen

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

• Ab 02/2022

Baubeginn

• Mai 2023

Fertigstellung

• Juli 2023

Neugestaltung Dorfplatz Hossingen



Planung : Büro Sigmund, Grafenberg
Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg
Firma: Fa. Werner, Haigerloch

Maßnahme abgeschlossen

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 02/2022

Baubeginn

- November 2022

Fertigstellung

- Oktober 2023

Erschließung Neubaugebiet „In der Breite“

2. Bauabschnitt

Oberdigisheim




Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
 Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
 Firma: Firma Storz, Tuttlingen

Maßnahme nahezu abgeschlossen

**Restarbeiten/Angleichungen im
Frühjahr 2024**

Kostenmonitoring :

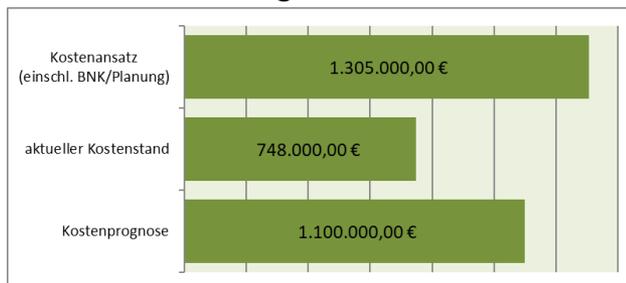

Planung / Ausschreibung

- ab 02/2022

Baubeginn

- April 2023

Gepf. Fertigstellung

- März 2024


Erneuerung Stützmauer Appental-/Buchstraße Unterdigisheim



Planung : Büro Breinlinger, Tuttlingen Bauleitung:
 Büro Breinlinger, Tuttlingen
 Firma: Firma Stotz, Balingen

**Tiefbaumaßnahmen abgeschlossen
 Geländermontage beauftragt.**

Kostenmonitoring :

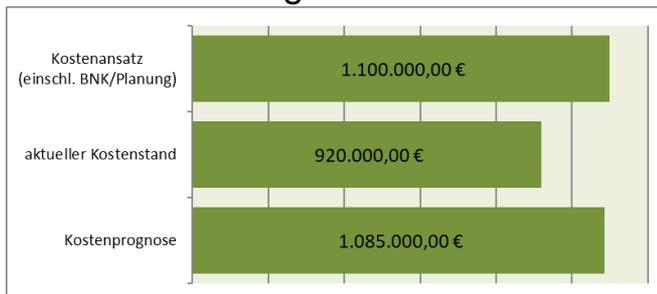

Planung / Ausschreibung

- ab 2021

Baubeginn

- Mai 2023

Fertigstellung

- November 2023

Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

- Kanalinnensanierungen
- Restliche LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
- Erneuerung Fenster Westseite an der Turn- und Festhalle
- Digitalisierung der Schulen
- Umgestaltung Freithofstraße / Ebingerstraße
- Dachsanierung Burgschule
- Erneuerung Fußweg „Bueloch“
- Sanierung Feldweg zum Wildgehege

- Innensanierung Turn- und Festhalle Oberdigisheim
- Fußweg/Treppenanlage Friedhof Oberdigisheim

- Endausbau Baugebiet Haldenstraße/Kirchhalde, Tieringen

- Erschließung Baugebiet „Oberdigisheimer Str.“, Unterdigisheim
- Dachsanierung Vereinshaus, Unterdigisheim

Laufende Planungen

- Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept
- Notstromversorgung Kläranlage
- Sporthalle Geißbühl – Machbarkeitsstudie

- Erweiterung Kindergarten Bueloch
- Umgestaltung Schulhof Burgschule
- Umgestaltung Schulhof Bueloch
- Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Heuberghalle
- Entlastungskanal Wirkerstraße

- Sanierung Turn- und Festhalle Hossingen

- Neubau Feuerwehrhaus Heinstetten

In 2023 abgeschlossene Maßnahmen

- Betonsanierungen Kläranlage
- Renovierung von 4 Klassenzimmern, Realschule
- Erneuerung von Schachtdeckeln in der OD Meßstetten
- Fassade und Außenanlage Jugendraum Meßstetten
- Sanierung Kleinspielfeld Schulzentrum Wildenstein
- Sanierung Wohngebiet Bueloch 5. BA , Friedrich-List-Straße

- Neugestaltung Kleinspielfeld, Hartheim
- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle Hartheim
- Erneuerung Jägerstraße Hartheim

- Neubau Löschwasserbehälter in Heinstetten
- Sanierung Schülertoiletten in Heinstetten

- Umbau und Erweiterung Kindergarten Hossingen
- Erweiterung der Urnenstelen, Friedhof Hossingen

- Erneuerung Heizung Rathaus, DRK, Feuerwehr Oberdigisheim

- Sanierung Gemeindestraße „Heidenhof“, Tieringen 2. Abschnitt
- Außentoilette Schlichemhalle in Tieringen
- Erneuerung der Hohnerstraße Tieringen
- Außenanlagen Kindergarten Tieringen

- Erneuerung des Pelletlagers , Turn- und Festhalle Unterdigisheim
